


ID	Descripción (Condición - Consecuencia)	Tipo	Probabilidad	Impacto	Exposición	Estado	Abordaje	Plan de Mitigación			Plan de Contingencia				Seguimiento del Riesgo
								Acción	Responsable	Fecha comprometida	Acción	Responsable	Fecha comprometida	Disparador	
1	Dado que el equipo aún está en proceso de aprendizaje, pueden surgir dificultades técnicas que generen retrasos.	Personas	Media	Alto	6	Mitigado	Reducir	Apoyarse en la documentación, dividir tareas según fortalezas, consultar dudas con docentes.	equipo	lunes 23-06-2025	Priorizar lo esencial y dejar lo accesorio si falta tiempo.	equipo	jueves 07-08-2025	Bloqueos en desarrollo / errores recurrentes	Surgieron dificultades que fueron abordadas en su momento por medio de investigación y priorización
2	Dado que el sistema se desarrolla como forma de aprendizaje, puede no contemplar todos los casos de uso reales esperados por un cliente futuro.	Proyecto	Media	Medio	4	Mitigado	Asumir	Documentar claramente qué está dentro y fuera del alcance desde el inicio.	equipo	Miercoles 07-08-2025	Aclarar límites del sistema durante la defensa.	equipo	Fecha a definir	Reclamos por falta de funcionalidades	La acción de mitigación se llevará a cabo en la defensa de la instancia del EXAMEN
3	Dado que el sistema no ha sido probado a fondo, podrían existir errores críticos en funcionalidades clave.	Tecnico	Alta	Alto	9	Cerrado	Reducir	Diseñar y ejecutar pruebas funcionales en los módulos clave.	equipo	lunes 23-06-2025	Corregir errores y reentregar si es posible.	equipo	jueves 07-08-2025	Errores detectados en módulos principales	Se generaron mejoras y se hizo una re entrega del proyecto
4	Dado que no fue testeado con usuarios reales, podría no ser suficientemente intuitivo o usable.	Producto	Media	Alto	6	Mitigado	Reducir	Realizar pruebas de usabilidad internas o con usuarios simulados.	equipo	lunes 23-06-2025	Incluir guía de uso o instrucciones.	equipo	Fecha a definir	Comentarios de confusión en la demo	Se probó la usabilidad del proyecto
5	Dado que no está optimizado, el sistema puede volverse lento o inestable con muchos datos.	Producto	Media	Medio	4	Cerrado	Reducir	Limitar volumen de datos en pruebas y monitorear recursos.	equipo	Miercoles 07-08-2025	Optimizar consultas o reducir carga.	equipo	jueves 07-08-2025	Sistema lento o cuelgues	Se limitó el volumen de datos y se buscó utilizar dispositivos que nuestras maquinas soportaran
6	Dado que el sistema no cuenta con backups automáticos, si se pierde la base de datos se perdería toda la información.	Tecnico	Alta	Alto	9	Cerrado	Reducir	Implementar backups manuales semanales durante el desarrollo.	equipo	Semanalmente. Antes del 23-06-2025	Reconstruir datos desde documentación o repetir carga.	equipo	NA	Fallo del sistema / pérdida de datos	No fue necesario su mitigación. El proyecto no manejaba datos sensibles de producción.
7	Dado que la conexión entre backend y base de datos no fue testeada con múltiples consultas simultáneas, puede fallar bajo carga.	Tecnico	Media	Alto	6	Mitigado	Reducir	Hacer pruebas con datos de prueba concurrentes y revisar logs.	equipo	lunes 23-06-2025	Reducir consultas simultáneas y ajustar la configuración de conexión.	equipo	miercoles 06-08-2025	Fallo del sistema	El sistema soporta las consultas que el equipo llevo a cabo
8	Dado que el equipo depende de herramientas externas para el diseño y ejecución de casos de prueba y para el reporte de defectos, se pierde independencia y control sobre estas herramientas.	Tecnico	Alta	Alto	9	Mitigado	Reducir	Contar con respaldo de los casos de pruebas y un reporte de las ejecuciones de forma semanal	equipo	Semanalmente	Reducir la dependencia a las herramientas que no son propias.	equipo	sábado 27-09-2025	No disponibilidad de las herramientas	Las herramientas se mantienen estables.
9	Dado que el equipo es reducido, si un integrante se retira o no participa más, se puede sobrecargar al resto.	Personas	Baja	Alto	3	Mitigado	Reducir	Documentar todas las tareas y decisiones, y compartir avances periódicamente.	equipo	NA	Redistribuir tareas entre los miembros activos y ajustar el alcance si es necesario.	equipo	domingo 29-06-2025	Ausencia / falta de respuesta	El equipo de trabajo sufrió una baja.
10	Dado que puede haber malentendidos con el docente respecto al alcance o requerimientos, el proyecto puede ser mal evaluado.	Proyecto	Media	Alto	6	Mitigado	Reducir	Validar con el docente los requerimientos y criterios de evaluación antes de la entrega.	equipo	lunes 23-06-2025	Dejar documentado qué se cubre y justificar decisiones en la defensa.	equipo	Fecha a definir	Requerimientos ambiguos / dudas no aclaradas	Se tomaron en cuenta los criterios de evaluación por medio de la rúbrica docente
11	Dado que puede fallar el entorno, o el equipo durante la defensa, no se podría mostrar el sistema correctamente.	Externo	Media	Alto	6	Mitigado	Reducir	Probar el sistema antes en el dispositivo que se usará.	equipo	lunes 21-07-2025	Continuar con explicación teórica y mostrar el video o capturas si no se puede ejecutar en vivo.	equipo	Fecha a definir	Falla de pc o red.	No fue necesario llevar a cabo la contingencia. No hubieron fallos.
12	Dado que pueden surgir errores inesperados durante el desarrollo, se puede retrasar la entrega del sistema.	Producto	Media	Alto	6	Mitigado	Reducir	Realizar revisiones frecuentes del código y pruebas constantes para detectar errores tempranos.	equipo	Tarea diaria hasta el 24-07-2025	Reorganizar tareas y priorizar entregables mínimos viables si se producen demoras.	equipo	Periodo de 05-08-2025 - 07-08-2025	Aparecen errores nuevos cerca de la fecha de entrega	Se priorizó la implementación de mejoras

[illegible]

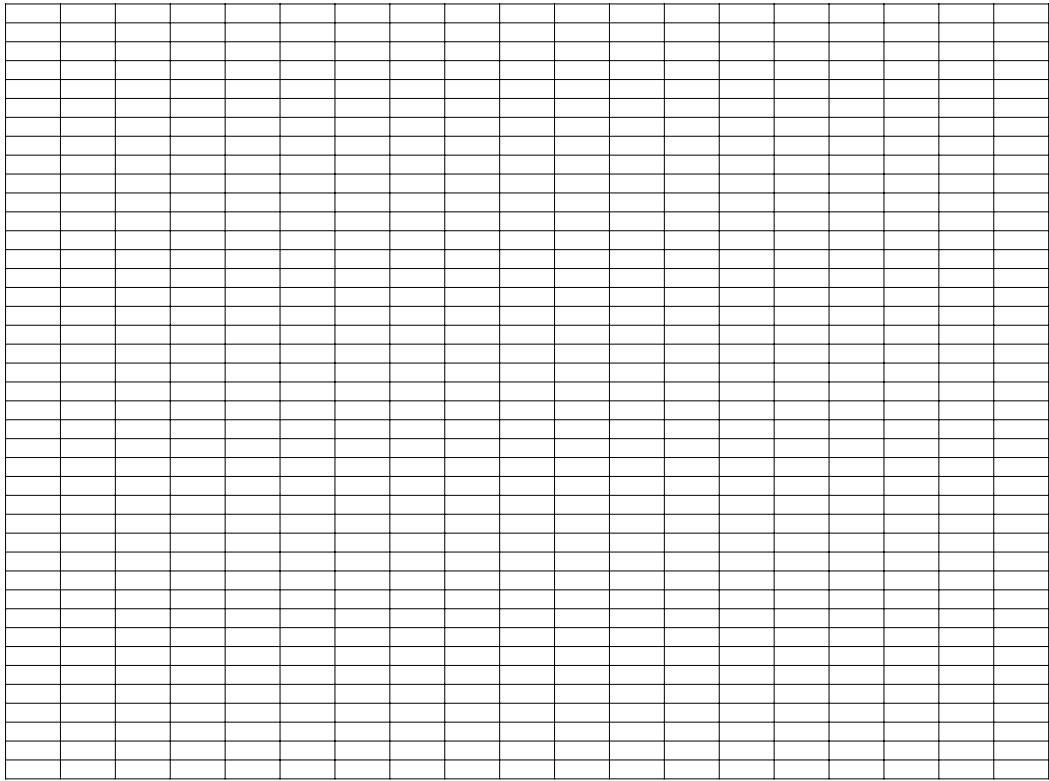

[illegible]
